



『選手村NOC／NPCサービスセンターその他仮設整備業務』 における大会延期に伴い発生する追加費用について


会場整備局 選手村整備チーム

2020年6月19日

1 付議概要

- ・ 大会延期に伴い、選手村NOC／NPCサービスセンターその他仮設整備業務に関して、以下の工事・業務を実施する。
 - ① 宿泊棟・商業棟仮囲い設置工事
建物の安全面と防犯面を考慮し、敷地内への関係者以外の立入禁止措置のために、閉鎖管理用の仮囲いを設置する。
 - ② 工事中止期間中の現場維持業務
既に設置した工作物の日常点検・報告業務及び延期に伴い生じる関係官庁との工程再調整等のための協議図面作成・提出等業務を実施する。

2 整備概要

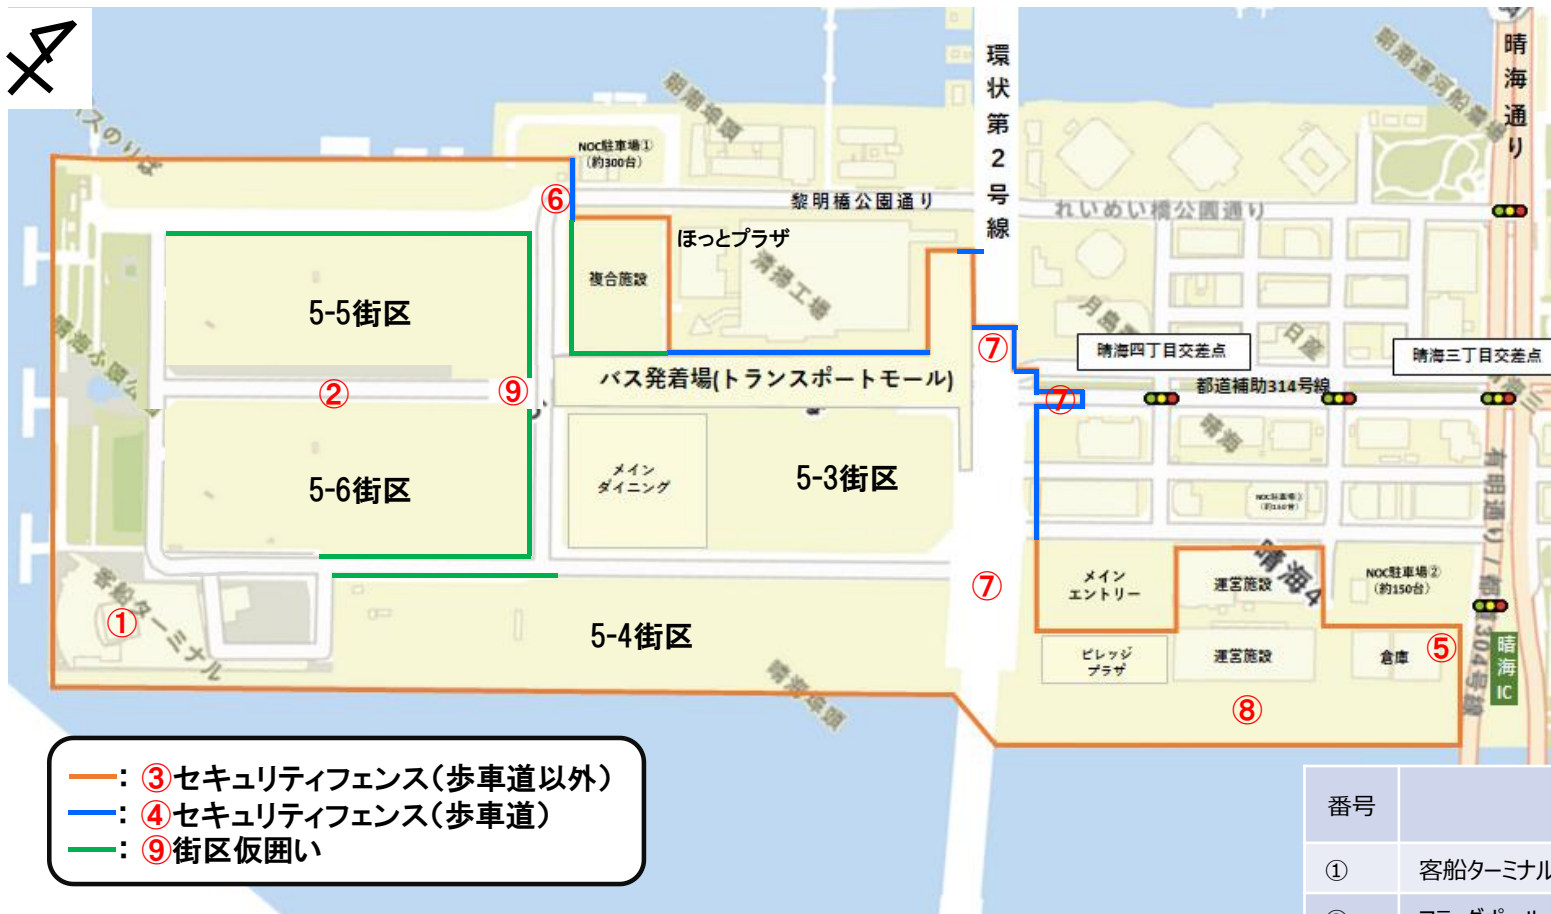

3 追加内容

➤ 維持管理業務期間：2021年6月22日～2021年12月28日

➤ 日常点検業務（各箇所に残置したオーバーレイ施設）

対象施設：①倉庫周りの敷鉄板車路、セキュリティフェンス（臨港署）、緑道公園内設備配管

②宿泊棟・商業棟仮囲い

③客船ターミナル内設備

内 容：残置物の固定や変形、劣化等を点検し報告する業務

➤ 延期に伴い生じた関係機関との再協議（占用図面作成・工程検討等）

内 容：④港湾局協議：新たな客船ターミナル利用計画を考慮した占用図面及び検討資料の作成・工程調整会議等の実施

⑤臨港消防署協議：棧橋利用計画を考慮した残置フェンスの管理調整と新たな消防活動計画に即した占用資料作成及び工程調整業務

⑥道路管理者協議：新たな大会計画に準じた道路占用協議及び交通管理者協議資料の作成と定例会議での説明業務

⑦港湾局協議：緑道公園及び埠とう公園内の残置物の占用延伸手続き及び新たな大会計画に準じた工程調整業務
