



オーバーレイブック更新等業務委託（その2） の発注について

会場整備局

1 決議事項

- ・競技会場のオーバーレイブック及びコンテインメント図の更新業務を委託する。

2 背景

- ・オーバーレイブックとは、IOC、IF、各FA等からの要件を踏まえ、各FA相互間が会場の整備内容を共通認識するために作成するもの
- ・これまで6か月ごとに更新を行ってきており、各FAの技術検討や運営計画の検討、OBSのレビューなどに活用されてきた。
- ・2019年度は、大会本番を間近に控え、運営に必要な情報を最終化させ、各FA間が共有する総合図としてオーバーレイブックを更新していく。

3 業務の内容について

(1) 件名

「オーバーレイブック更新等業務委託（その2）」（仮称）

(2) 業務概要

- ① オーバーレイブック更新業務
- ② コンテインメント図（各FAの設備配管図）の更新業務 など

4 仮設オーバーレイの全体計画①


	～2017年	2018年		2019年	2019年	2020年
		3月	9月	3月	9月	3月
Ver	～OB2.1	OB3.0	OB3.1	OB4.0	OB4.1	OB5.0
事業進捗			入札手続き・交渉		実施設計・整備	
OB図作成	基本設計		オーバーレイブック更新等業務①		オーバーレイブック更新等業務②	
内容	<ul style="list-style-type: none"> 大会要件を踏まえたブロックプラン（基本計画） 予算算出に活用 	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計の成果を図面化 発注金額の算出に活用 	<ul style="list-style-type: none"> 各F A要望の精緻化に伴う修正など 	<ul style="list-style-type: none"> 実施設計の一部を反映 コスト削減に伴う変更内容を反映 	<ul style="list-style-type: none"> コスト最適化を踏まえた実施設計の成果を反映 	<ul style="list-style-type: none"> オーバーレイブックの最終化

4 仮設オーバーレイの全体計画②


	2019年9月頃	2020年3月頃
Ver	OB4.1	OB5.0
内容	コスト最適化を踏まえた実施設計の成果を反映	施工着手前の最終調整を反映
具体例	<ul style="list-style-type: none"> ・実施設計の成果に応じた仮設物の配置 ・ブロードキャストコンパウンドの詳細化（ライツホルダーキャビンなどの規模・配置など） ・観客席におけるコメンタリーポジションなど関係者席の確定など 	<ul style="list-style-type: none"> ・各与条件（OBS、IF、VOP、VUAなど）の最終化に伴う図面修正 ・最終版はナレッジとしての資料としても活用（IOCからの要望）

5 オーバーレイブック更新イメージ (2019.3⇒2020.3)

〈V4.0相当：過去大会会場〉

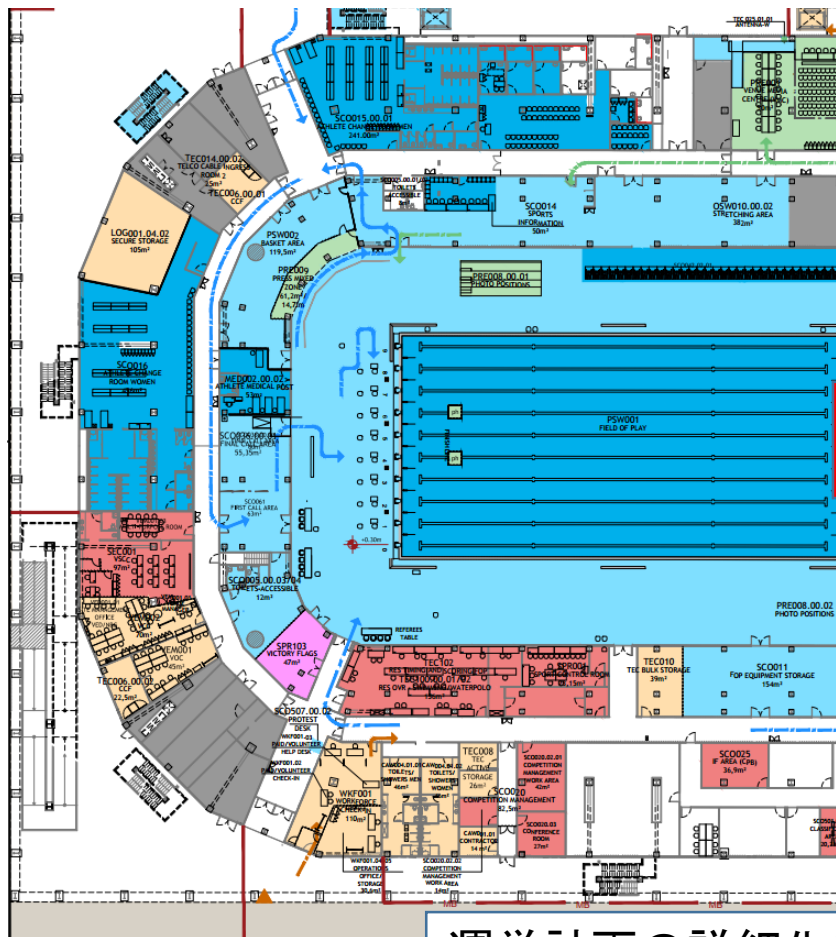

〈V5.0相当：過去大会会場〉


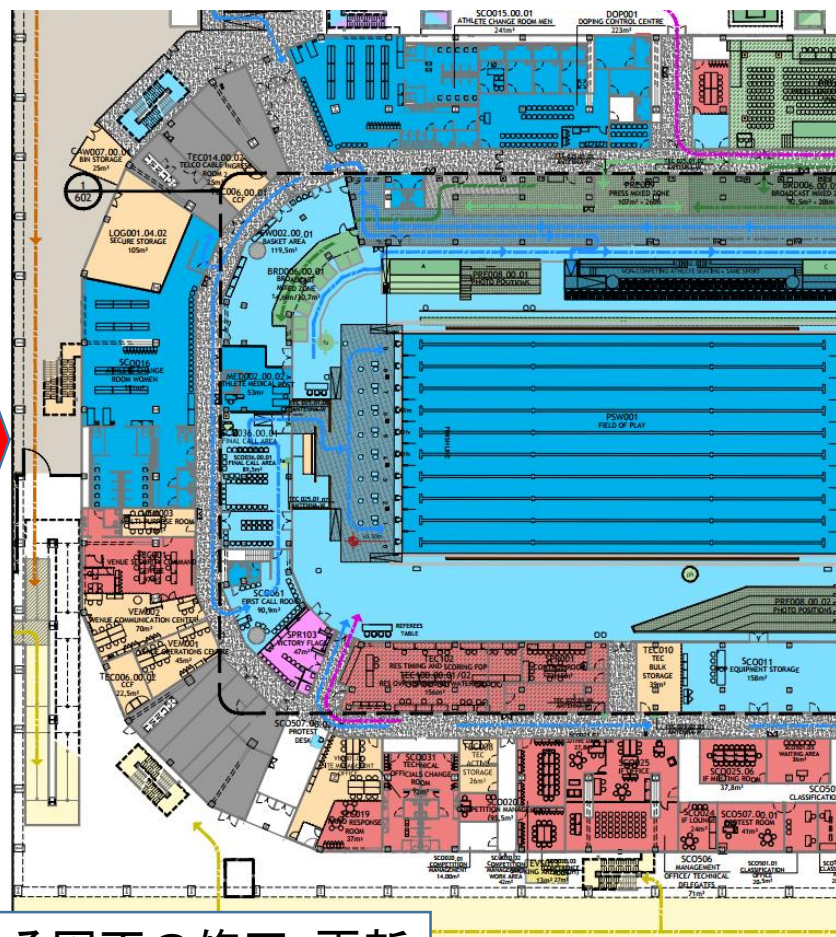


運営計画の詳細化による図面の修正・更新


6 コンテインメント図

海外ステークホルダーやOBSがケーブル敷設する配線ルートや仕様について組織委員会と協議するための資料

今後、OBSのレビューに応じて修正、更新が必要

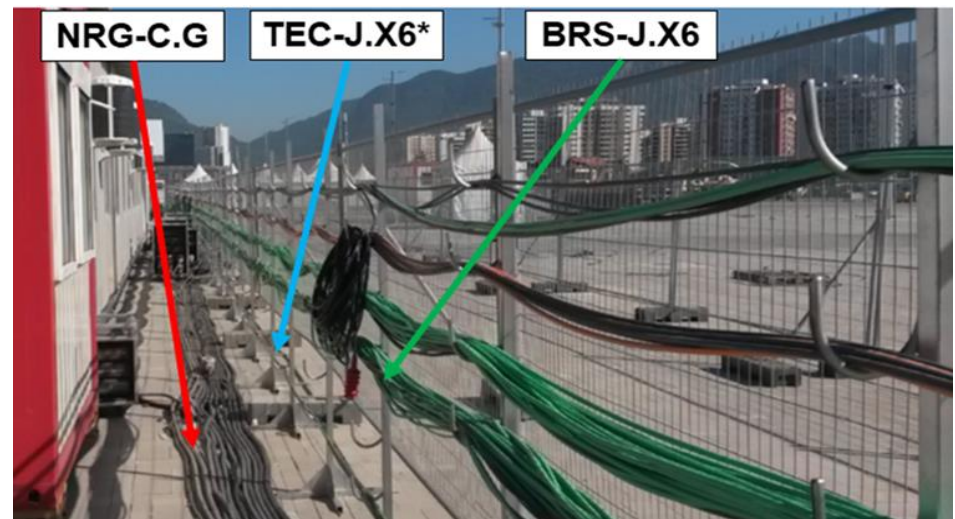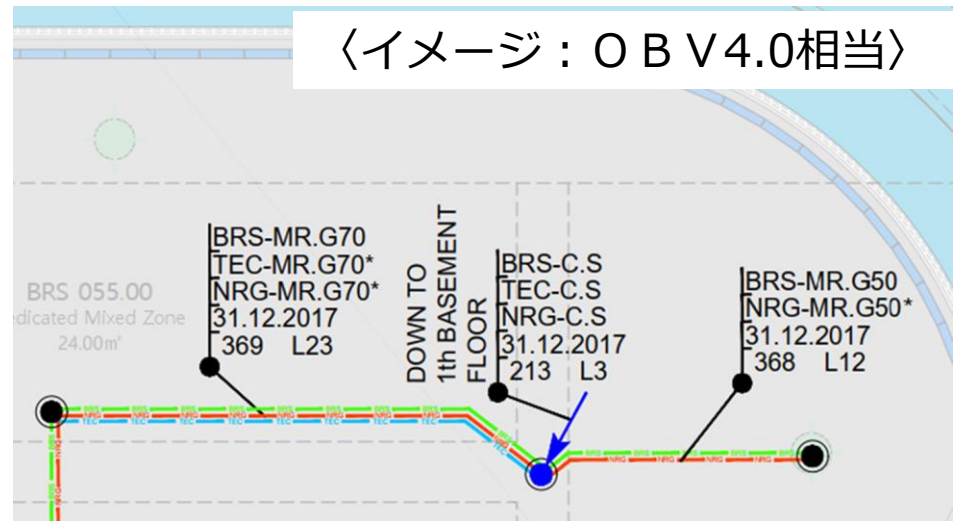

7 業務イメージ

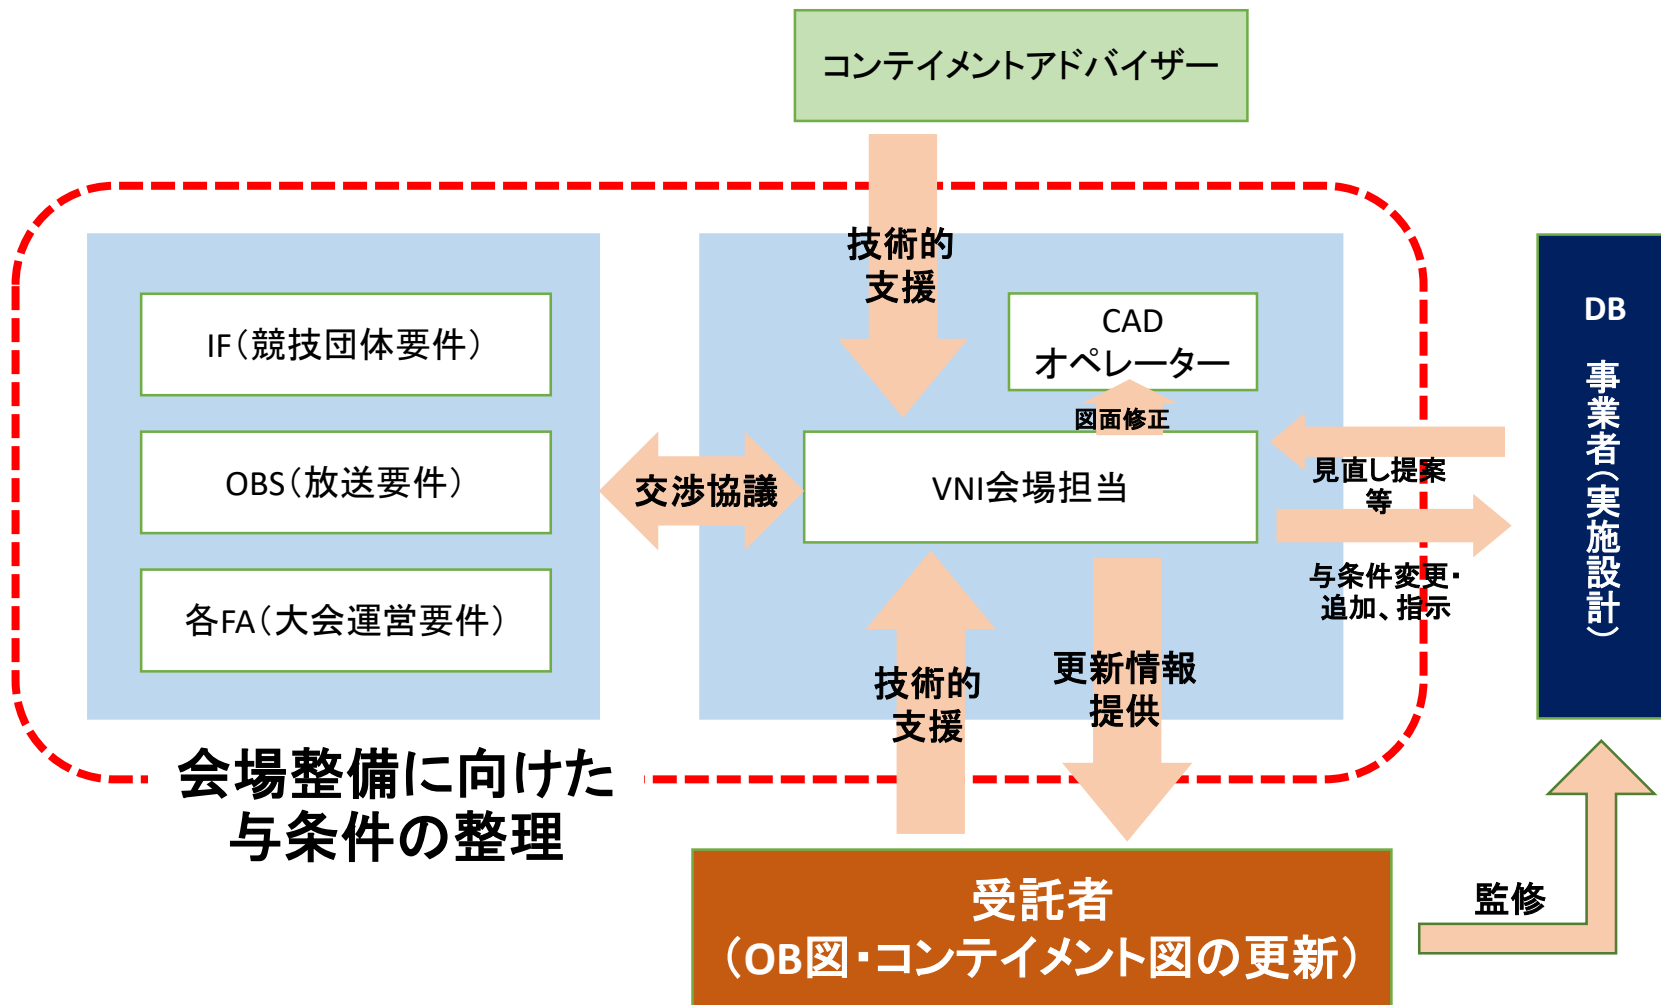

8 発注概要

(1) 予定調達方式 (調達管理委員会付議案件)

特別契約 (原則、基本設計を受託した設計事務所)

(2) 予定金額 (V3予算の範囲内)

国交省の定める標準単価により積算

(3) 予定契約期間

2019年5月～2020年3月末

参考 各会場の発注グループピング案

グループ1	1	新国立競技場（オリンピックスタジアム）	グループ7	1	札幌ドーム	
	2	東京体育館		2	宮城スタジアム	
	3	国立代々木競技場	グループ8	1	皇居外苑	
	4	日本武道館		1	国技館	
グループ2	1	海の森水上競技場	グループ9	2	有明アリーナ	
	2	海の森クロスカントリーコース		3	有明テニスの森	
	3	大井ホッケー競技場		4	有明BMXコース	
	4	カヌー・スラローム会場		5	横浜スタジアム	
	5	青海アーバンスポーツ会場		6	江の島ヨットハーバー	
	6	お台場海浜公園		7	福島あづま球場	
	7	潮風公園		グループ10	1	アーチェリー会場（夢の島公園）
	8	陸上自衛隊朝霞訓練場			2	武蔵野の森総合スポーツ施設
		3	東京スタジアム			
グループ3	2	霞ヶ関カントリー倶楽部	グループ11	1	オリンピックアクアティクスセンター	
グループ4	1	幕張メッセ Aホール		2	東京辰巳国際水泳場	
	2	幕張メッセ Bホール（Aに含む）	グループ12	1	富士スピードウェイ	
	3	幕張メッセ Cホール（Aに含む）		2	武蔵野の森公園	
グループ5	1	釣ヶ崎海岸サーフィン会場				
グループ6	1	さいたまスーパーアリーナ				
	2	横浜国際総合競技場				
	3	茨城カシマスタジアム				
	4	埼玉スタジアム2002				

黄色：4/24 作業部会

その他：5月 作業部会予定
